**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN****2024****Servicio de Contratación**

1.- Objeto	3
2.- Análisis general	4
3.- Análisis por centro gestor	8
4.- Tabla resumen por Centros Gestores	51
5.- Anexo-Memoria Servicio de Contratación	54

El documento ha sido firmado por :

- 1.- Mercedes Valls Palomino, Contratación - Jefa de Sección de Contratación Electrónica, Seguimiento de la Contratación y Compras, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/04/2025 09:48
- 2.- Laura Escribano Fernandez, en nombre de Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/04/2025 09:57

FIRMADO
04/04/2025 09:57



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2411380.SLUUY-U2OW8-4DXXJ.ED8566D34D4E63178D94249CC4E0BC7B04C36FE5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/?idocma=1>





1. Objeto

El actual Plan de Contratación 2024 fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en sesión ordinaria el 16 de abril de 2024, N° 5/140/2024.

En él, se enumeran las diferentes líneas de actuación estratégicas a seguir por el Servicio de Contratación, en concreto, entre ellas, la Línea de Actuación nº6 cuyo literal es el siguiente:

“Seguimiento y revisión del cumplimiento del Plan de Contratación. Análisis por dos ocasiones a lo largo del ejercicio presupuestario de ejecución del Plan del grado de cumplimiento del mismo y de la planificación temporal programada.”

Entre las funciones encomendadas al Servicio de Contratación se encuentra la del seguimiento del cumplimiento del Plan de Contratación, orientando la acción al logro en tiempo de las previsiones del Plan, ya que como cualquier otro instrumento de planificación, el Plan ha de ser objeto de evaluación posterior, ello en virtud de la obligación legal prevista en el artículo 6.2 y 8.1.a) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de evaluar y publicar con periodicidad determinada el grado de cumplimiento de los planes aprobados por las Administraciones Públicas, a efectos no sólo de transparencia de la información municipal, que asimismo, es objeto de obtención a través del perfil del contratante del órgano de contratación, sino a los efectos de obtener una visión global del estado en que se encuentra cada uno de los contratos programados al final de su ejercicio, de modo que la evaluación del Plan de Contratación mediante la comparación de los datos inicialmente previstos con los realmente obtenidos y/o ejecutados, nos permita corregir las deficiencias observadas, y encaminarnos a la mejora continua en la planificación y gestión de la contratación, y por ende, de la satisfacción de los fines institucionales de carácter público de la Corporación. Es lo que se conoce como una “perspectiva macro” o, “planificación estratégica” a través de la cual se busca, en sentido amplio, no solo asegurar la correcta gestión de cada uno de los expedientes y contratos que se precisan para atender las necesidades existentes (lo que sería una “perspectiva micro” o “planificación operativa”) sino implementar una dinámica o cultura de mejora continua en la gestión de la contratación pública para corregir los fallos que se vayan detectando y establecer los objetivos estratégicos a los que pretende darse prioridad, realizando un diagnóstico y adoptando medidas de mejora.

Con ello se consigue además potenciar la conciencia de los centros gestores en la importancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Contratación, de modo que permita una mejor planificación conjunta que redunde en alcanzar una contratación pública local profesionalizada, tecnológica, transparente, socialmente responsable e innovadora.

Respecto a la realización del presente informe hay que advertir que ha sido confeccionado de forma manual, mediante la comprobación de los antecedentes obrantes en el Servicio de Contratación y de los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, dado que actualmente se carece de herramienta de tramitación electrónica que permita realizar tal seguimiento y correspondiente emisión de informes automatizados que contengan datos cualitativos y cuantitativos.



2. Análisis general

En términos generales, en el Plan de Contratación 2024 aprobado están previstas 92 licitaciones nuevas a propuesta de los diferentes Centros Gestores en que se organiza administrativamente este Ayuntamiento, y que suponen un volumen económico global que asciende a 105.631.408,44 € en concepto de valor estimado (IVA excluido), recordando que éste abarca no sólo el precio de licitación sino el total sumatorio de anualidades (que en el caso de mayor duración abarca hasta 15 años), prórrogas y posibles modificaciones, quedando al margen de dicha programación los contratos menores y los basados en acuerdo marco celebrados por este Ayuntamiento, dado el carácter no planificable de los primeros, al no tener carácter recurrente, y el correspondiente carácter planificado de los segundos, respecto al acuerdo marco al que pertenecen.

De estos 92 contratos programados en el Plan de Contratación de 2024, 41 correspondían a contratos novedosos (algo menos de la mitad del total previsto, un 44,5%) y los 51 restantes daban continuidad a contratos previos que habían terminado su vigencia (55,4% sobre el total previsto), cuyo desglose por centros gestores es el siguiente:

Centro gestor	Número de contratos	Nuevos	Existe precedente
Asesoría Jurídica	1	0	1
Compras	8	2	6
Comunicación	3	0	3
Cultura	5	2	3
Deportes	1	0	1
Desarrollo Local	1	0	1
Educación	3	3	0
Festejos	9	0	9
Igualdad	1	0	1
Informática	11	7	4
Juventud	5	0	5
Limpieza viaria y residuos	2	1	1
Mantenimiento y regeneración urbana	10	7	3
Medio Ambiente	3	2	1
Obras Públicas	2	2	0
Organización y calidad	1	1	0
Participación Ciudadana	1	0	1
Patrimonio y Movilidad	3	1	2
Planificación	4	4	0
Policía Local	6	4	2
Protección Civil	2	2	0
Recursos Humanos	3	0	3
Atención Ciudadana	1	0	1
Salud	3	2	1
Servicios Sociales	3	1	2
TOTAL	92	41	51



El presente informe de seguimiento tiene en cuenta, además, que el Plan de Contratación es un instrumento planificador de necesidades futuras, y que requiere de su correspondiente adaptación a las necesidades reales existentes en el momento de su ejecución a lo largo del ejercicio al que corresponde, y es por ello, que en este informe se hace necesario incluir la información relativa a contratos "no programados" en el Plan de Contratación 2024 y que, sin embargo, han sido tramitados por el Servicio de Contratación, al estar justificada su necesidad sobrevenida por parte del Centro Gestor correspondiente.

Asimismo, hay que señalar que durante el 2024 se implementó una Instrucción, como novedad en la información a suministrar por los distintos Centros gestores en los Informes de Necesidad de los nuevos expedientes de contratación, relativa al señalamiento sobre la previsión de los citados expedientes en el Plan de Contratación y en la Agenda Urbana de San Sebastián de los Reyes, así como los motivos que justifican su no inclusión, en su caso.

De esta forma, podemos tener una visión más amplia de los objetivos que se pretenden satisfacer con los nuevos contratos y, en su caso, motivar la falta de su inclusión en otros.

Antes de comenzar al análisis individual, consideramos necesario incluir una descripción de cómo se va a estructurar la información analizada, a efectos de unificar criterios para facilitar su comprensión.

Por cada Centro Gestor, se va a utilizar una tabla, en la que aparecerán los siguientes datos estructurados en las siguientes columnas:

- **Objeto del contrato:** si está programado en el Plan de Contratación, aparecerá sombreado en **VERDE**, si no estaba previsto "no programado" aparecerá sombreado en **NARANJA**.
 - **Fecha prevista de inicio de licitación:** fecha propuesta por el centro gestor en el Plan de Contratación, teniendo en cuenta los tiempos de tramitación y la fecha prevista de comienzo de ejecución.
 - **Fecha real de inicio de licitación:** fecha en que se firma el acuerdo de incoación del expediente de contratación.
- Se indicarán en **ROJO** los expedientes que empiecen en fecha posterior a la prevista (retrasados), que produzcan un riesgo de desviación considerable en los tiempos de tramitación y, en su caso, inicio de ejecución.
- **Estado:**
 - o **Pendiente:** estado que identifica un contrato no tramitado a fecha 31/12/2024.
 - o **Desistido:** estado el que consta información sobre el desistimiento de la necesidad de tramitar el contrato formulado por el Centro Gestor. Equivalente a Contrato No Tramitado.
 - o **En preparación:** estado del contrato que se encuentra en preparación y firma de la documentación necesaria para confeccionar el expediente de contratación. Equivalente a Contrato Tramitado.
 - o **En revisión:** estado del contrato en que encontrándose confeccionada y suscrita la documentación necesaria por el centro gestor, se encuentra en revisión por el Servicio de Contratación.
 - o **Reprogramado:** estado del contrato no tramitado en el ejercicio al que pertenece el presente informe (2024), pero cuya necesidad permanece vigente y se programa en el Plan 2025. Equivalente a Contrato No Tramitado.



- **Publicado:** estado del contrato cuya convocatoria de licitación se ha publicado en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público para presentación de proposiciones. Equivalente a Contrato Tramitado.
- **Resuelto:** estado del contrato que se encuentra adjudicado. Equivalente a Contrato Tramitado.
- **Desierto:** estado del contrato que no se adjudica por no haber sido presentado ofertas o no ser aceptadas las presentadas por no adecuadas, irregulares o inaceptables. Equivale a Contrato Tramitado.
- **Iniciado con anterioridad:** estado del contrato no tramitado en el ejercicio al que pertenece el presente informe (2024), sino anterior. Equivalente a Contrato Tramitado.


- **Observaciones.** Incorporará datos aclaratorios, en su caso.

Pasando a analizar las cifras globales de licitación, debemos distinguir entre los términos "licitación" y "contrato".

Encontramos que se han iniciado en total **97 licitaciones** durante el ejercicio 2024, lo que supone una desviación de un 1,05% al alza sobre el número total previsto de 92, y de las cuales aproximadamente el **58% de ellas, 41 licitaciones, no estaban programadas inicialmente en el Plan de Contratación.**

De las 97 licitaciones, por tipo de procedimiento establecido, tenemos el siguiente desglose:

- Abierto Sujeto a Regulación Armonizada (SARA): 9 licitaciones.
- Abierto ordinario: 21 licitaciones.
- Abierto simplificado: 24 licitaciones.
- Abierto simplificado abreviado: 24 licitaciones.
- Negociado: 18 licitaciones.
- Privado: 1 licitación.

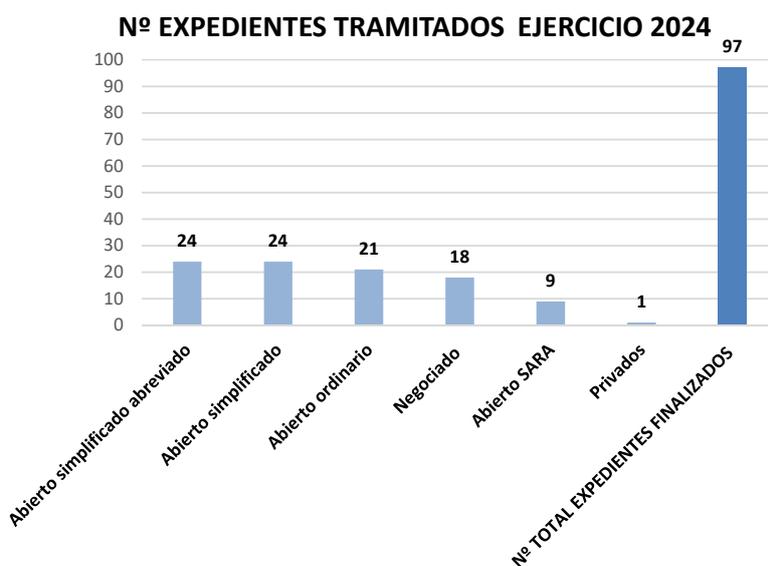




Sin embargo, si consideramos que muchas licitaciones están divididas en lotes (91 lotes, en total), el total de contratos tramitados en 2024 asciende a **201 contratos**. De estos:

- Pendientes: 4
- Desistidos: 5
- En preparación: 0
- En revisión: 0
- Reprogramados: 43
- Publicados: 35
- Resueltos: 100
- Desiertos: 12
- Iniciados con anterioridad: 2

Nº CONTRATOS INICIADOS (POR LOTES) EJERCICIO 2024

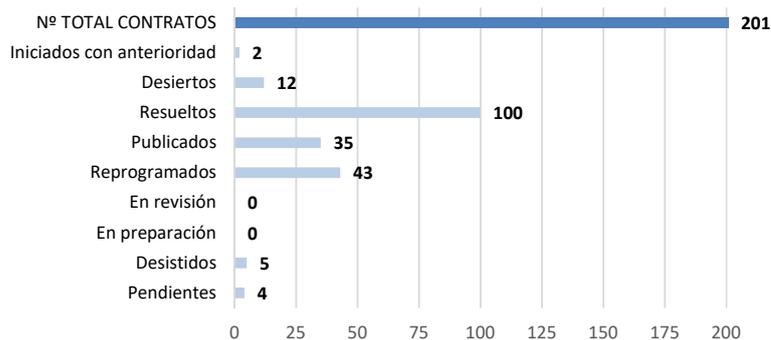

Respecto a la *desviación sobre las fechas* previstas de inicio de licitación, debemos puntualizar que se observa, sobre todo, en el primer semestre del ejercicio mayores desviaciones que, en algunos casos, se debieron a la falta de aprobación presupuestaria, con lo que ha supuesto una mayor de tramitación de contratos durante el segundo semestre, una vez aprobado el presupuesto, por acumulación de licitaciones durante ese período.

Teniendo en cuenta únicamente las desviaciones de inicio que pudiera tener un perjuicio en el retraso de los tiempos de licitación que afecten a la ejecución en sí de cada contrato, podemos decir que se han desviado de la fecha inicial marcada en el Plan de Contratación **57 licitaciones** de las 97 tramitadas, casi el 59% de éstas, de las cuales, no se han resuelto en el propio ejercicio 2024, 16 licitaciones, que suponen casi un tercio, el **28%** de las licitaciones que se han iniciado con retraso.

Por otra parte, debemos señalar que se han producido desviaciones a la baja en el precio de adjudicación respecto al precio de licitación en términos globales del **9,24%**.

Una vez analizadas las cifras globales, vamos a pasar a analizar individualmente, por centro gestor la ejecución del Plan de Contratación 2024.


3. Análisis por centro gestor

3.1. Asesoría Jurídica

ASESORÍA JURÍDICA								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Servicio de asistencia letrada y judicial en materia laboral, funcional (contencioso administrativo), y penal de los empleados públicos al servicio del Ayuntamiento, complementario de los servicios jurídicos municipales	Diciembre 2024		Reprogramado					

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

8



3.2. Contratación y Compras**CONTRATACIÓN Y COMPRAS**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Suministro, por renting, de fotocopiadoras y de equipos de impresión	Abril 2024	01/07/2024	Publicado	Abierto SARA	236.928 €	138.720 €	-41,45%	CON 41/24. Servicio de Impresión gestionada. Se cambia el modelo de servicio utilizado. Resuelto el 6/3/2025 por falta anterior de disponibilidad presupuestaria
Transporte discrecional con conductor	Abril 2024	24/04/2024	Resuelto	Abierto SARA	171.400 €	171.400 €	0%	CON 20/24 Techo máximo de gasto
Suministro de consumibles informáticos	Abril 2024		Reprogramado					
Suministro de material básico de oficina	Abril 2024	11/06/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	8.397,68 €	8.397,68 €	0%	CON 35/24 Techo máximo de gasto

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


9



Vestuario personal municipal	Junio 2024		Reprogramado						
Suministro de artículos de limpieza y aseo	Mayo 2024		Reprogramado						
Vending	Mayo 2024	29/10/2024	Desierto	Abierto ordinario	Canon (ingreso): 1.446,27 €/AÑO	N/D	N/D	CON 79/24. No se presentaban licitadores por solicitar máquinas combi concretas.	
Vending			Reprogramado	Abierto ordinario					
Reoting vehiculos municipales	N/D		Reprogramado						
Suministro e instalación de diverso mobiliario y otros enseres con destino a las distintas dependencias municipales	No programado	12/12/2024	Publicado	Abierto simplificado abreviado	24.710,74 €	24.710,74 €	0%	CON 93/24 Techo máximo de gasto. Adjudicado 24/02/2025	

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

10




3.3. Comunicación

COMUNICACIÓN									
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones	
Servicio de Diseño Corporativo	Enero 2024	01/02/2024	Resuelto	Abierto simplificado	44.000,00 €	44.000,00 €	0%	CON1/24. Techo de gasto	
Servicio de redacción y edición de vídeo	Enero 2024	05/03/2024	Resuelto	Abierto ordinario	41.607,54 €	39.527,16 €	-5%	CON 8/24	
Servicio de asesoramiento, planificación estratégica y compra de espacios en medios de difusión on line y off line para las campañas de publicidad institucional con medios y acciones de comunicación	Enero 2024	15/03/2025	Resuelto	Abierto SARA	200.000 €	200.000 €	0%	CON 7/24 Techo máximo de gasto	
Grabación vídeos y Reportajes Fiestas	No programado	17/06/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	9.000 €	5.900,40 €	-34,44%	CON 29/24 Antes contrato menor	

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

11




3.4. Cultura (bibliotecas)**BIBLIOTECAS**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Suministro y distribución de publicaciones periódicas	Enero 2024	09/02/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	11.942,31 €	11.345,19 €	-5%	CON3/24
Suministro de material con destino a bibliotecas municipales: libros y material multimedia	Septiembre 2024	12/07/2024	Publicado	Abierto simplificado	67.307,69 €	57.211,54 €	-15%	CON 47/24. Resuelto el 04/03/2025. Hubo Recurso Especial que estimó el TARC y se adjudicó al siguiente

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

12



*Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024*

15

Suministro de equipamiento y de audiovisuales para el Centro Cultural Emilio Aragón "MilkR"	No programado	14/11/2024	Lote 1: Resuelto Lote 2: Resuelto	Abierto simplificado abreviado	Lote 1: 2.479,34 € Lote 2: 3.725,96 €	Lote 1: 1.611,57 € Lote 2: 1.836,90 €	Lote 1: -35% Lote 2: -50,7%	CON 86/24
Lote Equipamiento de sonido	1:							
Lote Equipamiento expositivo	2:							

3.7. Deportes

DEPORTES								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Gestión indirecta de servicios deportivos	Agosto 2024		Reprogramado					
Asistencia Técnica Estudio de Viabilidad de Deportes	No programado	24/06/2024	Publicado	Abierto simplificado	36.199,17 €	27.150 €	-25%	CON 39/24. Este expediente se resuelve en 18/02/2025, por falta anterior de disponibilidad presupuestaria.
Organización de eventos deportivos	No programado		Reprogramado					CON 94/24

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

16



3.8. Desarrollo local

DESARROLLO LOCAL								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Organización de eventos de promoción y dinamización comercial Lote 1: Sansstock Lote 2: Feria del libro	Enero 2024	09/02/2024	Lote 1: Resuelto Lote 2: Resuelto	Abierto simplificado abreviado	Lote 1: 12.000 € Lote 2: 22.800 €	Lote 1: 10.200 € Lote 2: 18.696 €	Lote 1: -15% Lote 2: -18%	CON 4/24

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

17




3.9. Educación

EDUCACIÓN									
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones	
Programa de prevención y protección de factores de riesgo emocional y fortalecimiento de la convivencia escolar	Junio 2024	04/09/2024	Resuelto	Abierto simplificado	28.729,76 €	28.729,76 €	0%	CON 61/24 Techo máximo de gasto	
Agendas escolares y folleto Sanse Concilia	Junio 2024	19/03/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	11.475 €	11.475 €	0%	CON 11/24 Techo máximo de gasto	
Servicio de conservación para colegios públicos de Educación Infantil	No programado	30/09/2024	Publicado	Abierto SARA	1.018.776 €	N/D	N/D	CON 68/24. Actualmente pendiente de resolución de Recurso Especial en Materia de Contratación contra la adjudicación	

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

18




3.10. Festejos y turismo**FESTEJOS Y TURISMO**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Suministro alimentos caldereta y caldereta general. Lote 1: Elaboración Lote 2: Hinchables	Enero 2024	22/03/2024	Lote 1: Resuelto Lote 2: Resuelto	Abierto simplificado abreviado	Lote 1: 25.977,60 € Lote 2: 5.510 €	Lote 1: 23.639,61 € Lote 2: 3.306 €	Lote 1: -9% Lote 2: -40%	CON 16/24
Protección	Abril 2024	21/05/2024	Resuelto	Abierto simplificado	41.285,12 €	34.712,55 €	-15,91%	CON 25/24
Seguridad Fiestas	Marzo 2024	20/05/2024	Resuelto	Abierto simplificado	98.002 €	98.002 €	0%	CON 22/24 Techo máximo de gasto
Producción Musical y servicios auxiliares. Lote 1: Plaza Constitución y casco Lote 2: Anfiteatro y campo de fútbol	Abril 2024	31/05/2024	Lote 1: Resuelto Lote 2: Resuelto	Abierto simplificado	141.594 €	118.938,96 €	-16%	CON 26/24. Se decide hacer sin lotes, en varios recintos
Seguros encierros	Abril 2024	08/07/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	23.381,52 €	23.381,52 €	0%	CON 51/24
Artículos promocionales Lote 1, 2 y 3: productos promocionales. Varios (camisetas, pañuelos, delantales, pañuelos bordados, gorras, portatodos, neceseres)	Junio 2024	24/06/2024	Lotes 1-3: Resuelto Lote 4: Desierto	Abierto simplificado	Lote 1, 2, 3: 41.200 € Lote 4: 3.900 €	Lote 1, 2, 3: 41.200 € Lote 4: N/D	Lote 1, 2, 3: 0% Lote 4: N/D	CON 40/24 Lotes 1, 2 y 3 Techo máximo de gasto Lote 4: No existe en el mercado similar a lo solicitado

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


19



Lote 4: Alquiler de vehículo para su utilización como "oficina de venta" durante las Fiestas en honor del Stmo. Cristo de los Remedios.																			
Cabalqata	Junio 2024	08/10/2024	Resuelto	Abierto simplificado	70.422 €	69.013,56 €	-2%	CON 72/24											
Montaje de vallados de encierros y servicios auxiliares: Lote 1: vallados Lote 2: Servicios Auxiliares	Septiembre 2024	29/10/2024	Lote 1: Publicado Lote 2: Publicado	Abierto SARA	Lote 1: 232.936,43 € Lote 2: 48.723,49 €	Lote 1: 230.607,06 € Lote 2: 48.236,25 €	Lote 1: -1% Lote 2: -1%	CON 78/24 Formalizado el 31/01/2025											
Exhibición de reses y organización Fiestas	Septiembre 2024	17/10/2024	Publicado	Abierto ordinario	843.559,50 €	843.559,50 €	0%	CON 73/24. Formalizado el 10/01/2025											
Recinto ferial. Servicio de vigilancia y seguridad	Marzo 2024		Reprogramado																
Artistas 2 de Mayo Lote 1: La Misión Lote 2: Rubén Madrid y Xoxongorri	No programado	22/03/2024	Lote 1: Resuelto Lote 2: Resuelto	Negociado S/P	Lote 1: 17.900 € Lote 2: 3.550 €	Lote 1: 17.900 € Lote 2: 3.550 €	Lote 1: 0% Lote 2: 0%	CON 15/24											
Artista Dani Fernández	No programado	10/06/2024	Resuelto	Negociado S/P	96.000 €	96.000 €	0%	CON 30/24											
Artista Orquesta Panorama	No programado	10/06/2024	Resuelto	Negociado S/P	31.000 €	31.000 €	0%	CON 31/24											

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


20



Artista Pica Pica	No programado	10/06/2024	Resuelto	Negociado S/P	15.000 €	15.000 €	0%	CON 32/24
Artista Recycled J	No programado	10/06/2024	Resuelto	Negociado S/P	85.000 €	85.000 €	0%	CON 33/24
Artista Viva Suecia	No programado	10/06/2024	Resuelto	Negociado S/P	99.900 €	99.900 €	0%	CON 34/24
Artistas Anfiteatro 6 lotes. Lote 1: Antonio Molina Lote 2: Nancy's Rubias Lote 3: DJ Naro Lote 4: Brian Cross Lote 5: ERZ Lote 6: Mago de Oz	No programado	15/06/2024	Lote 1, 3, 4, 5 y 6: Resuelto Lote 2: Desierto	Negociado S/P	Lote 1: 36.000 € Lote 2: 22.000 € Lote 3: 6.500 € Lote 4: 3.800 € Lote 5: 600 € Lote 6: 27.000 €	Lote 1: 36.000 € Lote 2: N/D Lote 3: 6.500 € Lote 4: 3.800 € Lote 5: 600 € Lote 6: 27.000 €	Lote 1: 0% Lote 2: N/D Lote 3: 0% Lote 4: 0% Lote 5: 0% Lote 6: 0%	Lote 2: Nancy's Rubias - No aceptan las condiciones generales de cancelación
Artistas Plaza 11 lotes Lote 1: Fermandisco + banda municipal + DJ Axel Lote 2: Rubén Madrid Lote 3: Los Inspectores Lote 4: Los Morochos Lote 5: TERS Lote 6: Cosa de Dos Lote 7: Sallistre Lote 8: Inma Vilchez Lote 9: Darwin Lote 10: Juanlu Montoya Lote 11: DJ speaker Toni West	No programado	15/06/2024	Lote 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11: Resuelto Lote 6: Desierto Lote 4: Desierto	Negociado S/P	Lote 1: 5.800 € Lote 2: 1.500 € Lote 3: 1.700 € Lote 4: 6.600 € Lote 5: 9.000 € Lote 6: 3.000 € Lote 7: 8.600 € Lote 8: 6.500 € Lote 9: 2.500 € Lote 10: 15.000 € Lote 11: 500 €	Lote 1: 5.800 € Lote 2: 1.500 € Lote 3: 1.700 € Lote 4: N/D Lote 5: 9.000 € Lote 6: N/D Lote 7: 8.600 € Lote 8: 6.500 € Lote 9: 2.500 € Lote 10: 15.000 € Lote 11: 500 €	Lote 1: 0% Lote 2: 0% Lote 3: 0% Lote 4: N/D Lote 5: 0% Lote 6: N/D Lote 7: 0% Lote 8: 0% Lote 9: 0% Lote 10: 0% Lote 11: 0%	Lote 4 y 6: No aceptan las condiciones generales de cancelación

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


21



Artista Charangas y orquestas 9 lotes									
Lote 1: Orquesta VENECIA									
Lote 2: Orquesta PANTHER									
Lote 3: Orquesta SWING MACHINE									
Lote 4: Orquesta SCREAM									
Lote 5: Orquesta LA FACTORIA	No programado	20/06/2024	Lote 1-7 y 9: Resuelto Lote 8: Desierto	Negociado S/P	Lote 1: 6.000 € Lote 2: 8.100 € Lote 3: 5.000 € Lote 4: 7.300 € Lote 5: 9.200 € Lote 6: 13.700 € Lote 7: 11.000 € Lote 8: 6.580 € Lote 9: 7.000 €	Lote 1: 6.000 € Lote 2: 8.100 € Lote 3: 5.000 € Lote 4: 7.300 € Lote 5: 9.200 € Lote 6: 13.700 € Lote 7: 11.000 € Lote 8: N/D Lote 9: 7.000 €	Lote 1: 0% Lote 2: 0% Lote 3: 0% Lote 4: 0% Lote 5: 0% Lote 6: 0% Lote 7: 0% Lote 8: N/D Lote 9: 0%	CON 38/24 Lote 8: No cumple requisitos para licitar en Plataforma	
Lote 6: Orquesta MAXIMS									
Lote 7: Charanga Xoxongori									
Lote 8: Charanga El Mono									
Lote 9: Charanga Asamblea de Majaras									
Artista Los Morochos	No programado	11/07/2025	Resuelto	Negociado S/P	6.600 €	6.600 €	0%	CON 48/24 Proveniente del desierto CON 37/24 Lote 4	
Artista Nancy's Rubias	No programado	12/07/2025	Resuelto	Negociado S/P	22.000 €	22.000 €	0%	CON 49/24 Proveniente del desierto CON 36/24 Lote 2	
Trashumancia	No programado	08/07/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	26.040 €	26.040 €	0%	CON 50/24 Anteriormente se tramitaba como contrato menor	
Artistas Fiestas: Lote 1: Cosa de Dos	No programado	12/07/2024	Lote 1: Resuelto	Negociado S/P	Lote 1: 3.000 € Lote 2: 6.580 €	Lote 1: 3.000 € Lote 2: 6.580 €	Lote 1: 0% Lote 2: 0%	CON 53/24	

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


22



Lote 2: Charanga El Mono	Lote 2: Resuelto	Lote 2: Resuelto	Abierto simplificado	33.950 €	48.300,25 €	-2,14%	CON 83/24
Organización de espectáculos culturales, lúdicos y musicales durante las fiestas navideñas	No programado	04/11/2024	Abierto simplificado	49.361,52 €	48.300,25 €	-2,14%	CON 83/24
Servicio de organización de espectáculos culturales, lúdicos y musicales durante el ciclo festivo de San Sebastián Mártir de enero de 2025.	No programado	29/11/2024	Abierto simplificado abreviado	33.950 €	31.889,23	-6,07%	CON 90/24

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

23





3.12. Informática y Nuevas Tecnologías**INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Mantenimiento SALS	Junio 2024	05/11/2024	Publicado	Abierto simplificado abreviado	10.112 €	5.811,82 €	-42,53%	CON 82/24 Formalizado 31/01/2025
Sanse WIFI	Abril 2024	14/08/2024	Resuelto	Abierto ordinario	82.000 €	69.552,70 €	-15,17%	CON 57/24
Mantenimiento Videoacclas Pleno	Marzo 2024	12/04/2024	Resuelto	Negociado S/P	23.700 €	23.700 €	0%	CON 14/24
Auditoría Cyberseguridad ENS	Junio 2024		Reprogramado					
Suministros HW. Lote 1: equipos usuario Lote 2: Electrónica de red Lote 3: teléfonos IP Lote 4: monitores	Mayo 2024		Lote 1: Publicado Lote 2: Publicado Lote 3: Publicado Lote 4: Publicado	Abierto simplificado	Lote 1: 14.723,34 € Lote 2: 650 € Lote 3: 1.560 € Lote 4: 4.347 € Lote 5: 2.700 € Lote 6: 10.750 €	Lote 1: 10.575,48 € Lote 2: 547,43 € Lote 3: 1.493,31 € Lote 4: 3.129,75 € Lote 5: 2.400 € Lote 6: 4.975,10 €	Lote 1: -28,13% Lote 2: -15,78% Lote 3: -4,27% Lote 4: -28% Lote 5: -11,11% Lote 6: -53,72% Lote 7: -11,67% Lote 8: -49%	Refundido con expediente CON 69/24 CON 69/24
Suministros SW. Lote 1: office 365 Lote 2: SW CAD Lote 3: Ampliación licencia VeeamBackup Lote 4: otros Presto, Adobe	Mayo 2024	03/10/2025	Lote 5: Publicado Lote 6: Publicado Lote 7: Publicado Lote 8: Publicado	Abierto simplificado	Lote 7: 66.000 € Lote 8: 25.500 €	Lote 7: 58.297,60 € Lote 8: 13.005 €		CON 69/24. Formalizados los contratos en 2025. Lote 1: Suministro de licencias Microsoft 365 Empresa Estándar y licencias Copilot para Microsoft 23/01/2025

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

25



*Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024*

26

Nuevo sistema de gestión tributaria y Recaudación	Junio 2024		Reprogramado					Lote 2: Suministro de licencia de la aplicación Crystal Reports 07/02/2025 Lote 3: Suministro de licencias Autocad LT. Lote 4: Suministro de licencias Adobe 06/02/2025 Lote 5: Suministro de computadores de red 07/02/2025 Lote 6: Suministro de equipos de alimentación ininterrumpida 06/02/2025 Lote 7: Suministro de ordenadores personales 06/02/2025 Lote 8: Suministro de monitores para PC 06/02/2025
Nuevo sistema de gestión de actividades	Febrero 2024	06/02/2024	Resuelto	Abierto ordinario	61.000 €	43.200 €	-29,18%	CON 2/24
Servicio de asesoramiento jurídico	Febrero 2024	01/03/2024	Resuelto	Negociado S/P	43.350 €	43.350 €	0%	CON 6/24

El documento ha sido firmado por :

1.- Mercedes Valls Palomino, Contratación - Jefa de Sección de Contratación Electrónica, Seguimiento de la Contratación y Compras, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/04/2025 09:48
2.- Laura Escoribano Fernandez, en nombre de Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/04/2025 09:57

FIRMADO

04/04/2025 09:57



Mantenimiento Flexia Consulta y ENI	Julio 2024	30/09/2024	Resuelto	Negociado S/P	6.500 €	6.500 €	0%	CON 66/24
Software en la nube metodología BIM Obras	Septiembre 2024		Pendiente					
Servicio de mantenimiento de la aplicación de gestión integral de protección civil	No programado	30/09/2024	Resuelto	Abierto ordinario	9.000 €	8.760,00	-2,66%	CON 67/24
Servicio de integración de la aplicación de registro de E/S con la plataforma Sistema de Intercambio de Registro (SIR) para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes	No programado	31/10/2024	Publicado	Abierto ordinario	17.200 €	17.200 €	0%	CON 80/24 Formalizado 11/03/2025
Servicio de mantenimiento y soporte técnico en su modalidad ilimitada en horas de asistencia técnica "Albalá Gestión documental"	No programado	13/12/2024	Publicado	Negociado S/P	16.008 €	16.008 €	0%	CON 92/24 Formalizado contrato el 17/03/2025

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

27


El documento ha sido firmado por :

- Mercedes Valls Palomino, Contratación - Jefa de Sección de Contratación Electrónica, Seguimiento de la Contratación y Compras, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/04/2025 09:48
- Laura Escribano Fernandez, en nombre de Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/04/2025 09:57

<p>servicio de coordinación, de control de acceso y gestión de los locales de ensayo del Centro Juven</p> <p>Servicio de alojamiento, mantenimiento, y actividades para la ejecución y desarrollo del campamento juvenil multiaventura con inglés 2025 organizado por la Delegación de Juventud e Infancia e Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.</p>	<p>Julio 2024</p> <p>No programado</p>	<p>15/07/2024</p>	<p>Resuelto</p>	<p>Abierto ordinario</p>	<p>69.971,15 €</p>	<p>69.971,15 €</p>	<p>0%</p>	<p>CON 54/24 Techo máximo de gasto</p>
		<p>13/01/2025</p>	<p>Publicado</p>	<p>Abierto simplificado</p>	<p>21.503,97 €</p>	<p>N/D</p>	<p>N/D</p>	<p>CON 99/24 En licitación</p>

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

29




3.14. Limpieza viaria y residuos urbanos

LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS URBANOS								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Servicio de limpieza de pintadas	Abril 2024	12/12/2024	Publicado	Abierto ordinario	300.000 €	N/D	N/D	CON 89/24 Techo máximo de gasto
Limpieza viaria: lote 1 y lote 2	Abril 2024	14/12/2023	Iniciado con anterioridad (2 lotes)					Iniciado en 14/12/2023 expediente iniciado anteriormente a la entrada en vigor del ejercicio (CON 80/23)

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

30




3.15. Mantenimiento y Regeneración Urbana

MANTENIMIENTO Y REGENERACIÓN URBANA								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Acuerdo Marco Obras: Lote 1: CEIP y escuelas infantiles, instalaciones deportivas Lote 2: Edificios municipales Lote 3: pintura	Abril 2024	26/11/2024	Lote 1: Publicado Lote 2: Publicado Lote 3: Pendiente	Abierto SARA	Lote 1: 3.305.786,12 € Lote 2: 1.652.892,56 € Lote 3: N/D	Lote 1: 2.089.256,20 € Lote 2: 1.044.628,10 € Lote 3: N/D	Lote 1: -36,79% Lote 2: -36,79% Lote 3: N/D	CON 62/24. Informe Propuesta de adjudicación en fecha 17/02/2025. No formalizado aún
Acuerdo Marco Redacción de Proyectos y DF. Lote 1: proyectos de rehabilitación Lote 2: proyectos de instalaciones de eficiencia energética	Abril 2024	26/11/2024	Lote 1: Publicado Lote 2: Publicado	Abierto SARA	Lote 1: 289.256,20 € Lote 2: 123.966,94 €	Lote 1: N/D Lote 2: N/D	Lote 1: N/D Lote 2: N/D	CON 64/24. En licitación
Suministro de energía y gas a instalaciones municipales Lote 1: electricidad Lote 2: gas	Abril 2024	17/07/2024	Lote 1: Resuelto Lote 2: Resuelto	Abierto SARA	Lote 1: 1.652.075,33 € Lote 2: 369.293,03 €	Lote 1: 1.541.155,19 € Lote 2: 333.710,01 €	Lote 1: -6,71% Lote 2: -9,63%	CON 52/24 Suministro de energía eléctrica 100% renovable y gas natural a los Colegios de Educación Infantil y Primaria, edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


31



Mantenimiento grada telescópica	Marzo 2024		Reprogramado						
Obras de Lijado y barnizado del Pabellón Valvanera	Abril 2024		Reprogramado						
Reparación de Luces del Campo de Hockey sobre hierba	Abril 2024	24/06/2024	Resuelto	Abierto simplificado	59.495,88 €	33.906,70 €	-43%	CON 28/24. Suministro e Instalación de Proyector LED para el Campo de Hockey Municipal	
Protección del vallado perimetral del campo de fútbol del Polideportivo Municipal Dehesa Boyal	Abril 2024	13/06/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	31.131,78 €	26.462,01 €	-15%	CON 27/24 Suministro e instalación de protecciones mecánicas de distintos elementos rígidos presentes en instalaciones deportivas municipales	
Sustitución de proyectores en Campos Municipales Gabriel Pedregal	Abril 2024		Reprogramado						
Obras de reforma bajos Silvio Abad	Septiembre 2024		Reprogramado						
Servicio de mantenimiento y de gestión de eficiencia energética en	Septiembre 2024		Reprogramado						

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


32



Instalaciones deportivas											
Suministro de Energía eléctrica al recinto ferrial y a las casetas de asociaciones durante las fiestas patronales de Agosto	No programado	08/07/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	33.229,82 €	26.743,74 €	-19,51%	CON 43/24			
Redacción de Proyecto y DF y coordinación de seguridad y salud para las obras de construcción del Nuevo Centro Municipal de Servicios	No programado	03/10/2024	Publicado	Abierto simplificado	142.000 €	90.009,00 €	-36,61%	CON 63/24 Contrato formalizado el 10/03/2025			

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

33




3.16. Medio ambiente

MEDIO AMBIENTE								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Servicio de dinamización de huertos urbanos y de la red de huertos escolares ecológicos SSR	Abril 2024		Reprogramado					
Servicio redacción del "Plan de Infraestructura Verde SSR"	Marzo 2024	02/09/2024	Resuelto	Abierto simplificado	21.793,64 €	15.255,54 €	-30%	CON 59/24 Asistencia técnica para elaboración de solicitud de fondos FEDER (gestionados por la Fundación Biodiversidad) destinados al impulso de la Infraestructura verde en entornos urbanos
Servicio de limpieza y recogida de residuos en el medio rural	Septiembre 2024		Reprogramado					
Suministro y obra es la sustitución de los equipos de bombeo de la (EBAR) de Club de Campo	No programado	31/10/2024	Desierto	Abierto simplificado	22.282,15 €	N/D	N/D	CON 75/24 Según informe técnico ambas mercantiles incumplen los requisitos exigidos en el PPT

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

34



Suministro y obras de la sustitución de los equipos de bombeo de la (EBAR) de Club de Campo	No programado	26/12/2024	Publicado	Negociado S/P	22.282,15 €	N/D	N/D	CON 96/24 En licitación
Suministro de materiales para huertos urbanos Lote 1: Adquisición de taquillas y bancos para las casetas de vestuario Lote 2: Adquisición de mesas de cultivo en altura para huertos personas con diversidad funcional	No programado	12/12/2024	Lote 1: Desistido Lote 2: Desistido	Abierto simplificado abreviado	Lote 1: 10.849,60 € Lote 2: 2.439,67 €	Lote 1: N/D Lote 2: N/D	N/D Desistido	CON 91/24. Se desiste de uno de los lotes y se decide tramitar por contrato menor, una vez en proceso de licitación.
Suministro e instalación de juegos de agua para la creación de un refugio climático y de esparcimiento infantil en la zona verde municipal situada frente al Paseo de Europa nº12	No programado	26/12/2024	Publicado	Abierto ordinario	296.106,90 €	N/D	N/D	CON 95/24 En proceso de licitación

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

35




3.17. Obras y servicios públicos**OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Servicio de asistencia técnica de apoyo a la inspección y control del Servicio de conservación y mantenimiento de las vías públicas de San Sebastián de los Reyes	Enero 2024		Pendiente					
Obras de refuerzo del firme en viales prioritarios	Abril 2024	12/07/2025	Resuelto	Abierto simplificado	779.116,55 €	582.389,62 €	-25,25%	CON 44/24
Emergencia Obras Paseo de Europa	No programado	01/03/2025	Resuelto	Emergencia				CON 9/24
Suministro de elementos de mobiliario urbano destinado a las Vías Públicas Lote 1: Pilonas o bolardos de acero, tanto en versión emportable fija como extraíble Lote 2: Papeletas para colocación en poste o columna, tanto en versión básica como dotadas de cenicero.	No programado	08/10/2024	Lote 1: Resuelto Lote 2: Resuelto	Abierto simplificado abreviado	Lote 1: 10.698,62 € Lote 2: 20.134,40 €	Lote 1: 10.698,62 € Lote 2: 20.134,40 €	Lote 1: 0% Lote 2: 0%	CON 71/24 Techo máximo de gasto

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

36




3.18. Organización y calidad**ORGANIZACIÓN Y CALIDAD**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto Actividades de Tratamiento de Protección de Datos	Enero 2024	29/10/2024	Publicado	Abierto simplificado	14.000 €	N/D	N/D	CON 74/24 En licitación


Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

37



3.19. Participación ciudadana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Feria-Encuentro y Festival de Asociaciones.	Mayo 2024	12/07/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	15.000 €	11.850 €	-21%	CON 55/24"Servicio de organización y celebración de la Jornada de las asociaciones 2024"




3.20. Patrimonio

PATRIMONIO								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Gestión del apartamiento Plaza del Tejar/ Calle Postas 2	Junio 2024	29/05/2024	Resuelto	Abierto simplificado	67.570,79 €	61.827,27 €	-8,5%	CON 21/24
Asistencia técnica en la aplicación GPA de gestión integral del patrimonio e inventario municipal	No programado	04/10/2024	Resuelto	Abierto ordinario	22.820 €	22.740 €	-0,35%	CON 70/24
Cesión del derecho de superficie sobre parcela sita en calle Severo Ochoa nº 1, U.E. 12 "Pilar de Abajo" en San Sebastián de los Reyes, mediante adjudicación directa a la empresa municipal EMSV y con objeto de construir y explotar de forma privada edificio de viviendas para alquiler.	No programado	23/10/2024	Pendiente	Privado	No implica gasto	N/D	N/D	CON 100/24 El valor de tasación sería de 12.237.416,70 € que resulta de la suma de los valores tasados de las dos parcelas agrupadas según los informes de tasación referenciados.

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

39




3.21. Promoción del transporte y movilidad**MOVILIDAD Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Asistencia técnica desarrollo PMUS: de plan desarrollo del transporte público	Junio 2024		Reprogramado					
Gestión de la zona regulada o zona ORA	Junio 2024	23/10/2024	Publicado	Abierto simplificado	18.554,22 €	11.099,13 €	-40,18%	CON 76/24 Asistencia técnica elaboración de análisis normativo y asesoramiento técnico licitación del servicio de aparcamiento regulado. Formalizado 03/02/2025


Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

40



3.22. Planificación y financiación pública**PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN PÚBLICA**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Asistencia Técnica Agenda Urbana	Mayo 2024		Reprogramado					
Asistencia Técnica Observatorio Ciudad	Mayo 2024		Reprogramado					
Indicadores Agenda Urbana datos fuentes secundarias	Mayo 2024		Reprogramado					
Asistencia Técnica Proyectos Financiación Europea	Mayo 2024		Reprogramado					



3.23. Policia local**POLICIA LOCAL**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Suministro de vestuario y equipación Lote 1: vestuario Lote 2: equipación	Junio 2024	14/08/2024	Lote 1: Desistido Lote 2: Desistido	Abierto ordinario	72.210 €	N/D	N/D	CON 58/24 El 15/10/2024 desde Concejalía se pide cierre al no incorporarse este año los policías de nuevo ingreso previsto para este mes de octubre. Se procederá a la apertura de un nuevo expediente que incluya el mantenimiento y renovación del conjunto de la uniformidad para toda la plantilla.
Suministro de uniformidad de la policia local de nuevo ingreso (Lote 1: prendas y efectos, Lote 2: equipo) de San Sebastián de los Reyes.	No programado	14/11/2024	Lote 1: Desierto Lote 2: Desierto	Abierto ordinario	Lote 1: 78.995 € Lote 2: 81.125 €	Lote 1: N/D Lote 2: N/D	Lote 1: N/D Lote 2: N/D	CON 87/24 Excluidas las licitadoras por ni cumplir el PPT
Suministro de uniformidad de la	No programado	08/01/2025	Lote 1: Publicado	Negociado C/P	Lote 1: 78.995 €	Lote 1: N/D Lote 2: N/D	Lote 1: N/D Lote 2: N/D	CON 98/24 En licitación.


Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

42



1

verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/fdo/mas=1> Mediante el código de



Municipiones	Abril 2024		Reprogramado					
Medallas y condecoraciones	No programado	04/04/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	11.789,40 €	11.789,40 €	0%	CON 13/24 Techo máximo de gasto
Medallas y condecoraciones	No programado	04/04/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	11.789,40 €	11.789,40 €	0%	CON 13/24 Techo máximo de gasto
Medallas y condecoraciones	No programado	04/04/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	11.789,40 €	11.789,40 €	0%	CON 13/24 Techo máximo de gasto

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

44

3.24. Protección civil**PROTECCIÓN CIVIL**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Vestuario	Mayo 2024		Reprogramado					
Mantenimiento desfibriladores	Mayo 2024	27/03/2024	Resuelto	Abierto simplificado	13.320 €	9.413,24 €	-29,33%	CON 17/24

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

45




3.25. Recursos humanos

RECURSOS HUMANOS								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Servicio de prevención ajena	Abril 2024	29/04/2024	Resuelto	Abierto simplificado	23.690 €	21.144,01 €	-10,74%	CON 19/24
Seguro colectivo de vida e incapacidad	Abril 2024	21/05/2024	Desierto	Abierto ordinario	180.000 €	N/D	N/D	CON 23/24
Seguro colectivo de vida e incapacidad	Abril 2024	02/09/2024	Resuelto	Abierto ordinario	200.000 €	199.714,38 €	-0,14%	CON 18/24 La concejalía de seguridad manifiesta, en fase de aprobación del expediente, que carece de interés en esta formación al existir profesionales formados y capacitados en la plantilla de Policía Local.
Formación drones	Enero 2024	09/04/2024	Desistido	Abierto simplificado	23.515 €	N/D (No tramitado)	N/D (No tramitado)	

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


46




Pruebas psicotécnicas para oposiciones Policía Local	No programado	05/07/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	17.700 €	17.700 €	0%	CON 46/24 Techo máximo de gasto
Suministro en régimen de alquiler, transporte, montaje y desmontaje, mobiliario necesario (sillas y mesas) para la celebración de los exámenes Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes	No programado	16/07/2024	Resuelto	Abierto simplificado abreviado	44.625 €	44.625 €	0%	CON 56/24 Techo máximo de gasto

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

47



*Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024*

48

3.26. Servicio de Atención Ciudadana


SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Servicio de atención telefónica del Ayuntamiento	Octubre 2024	13/01/2025	Publicado	Abierto SARA	317.014,16 €	N/D	N/D	CON 97/24 En licitación

3.27. Salud

SALUD								
Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Gestión integral para la recogida, albergue y custodia de animales abandonados incluida la retirada y gestión de animales muertos	Abril 2024	05/02/2025	Reprogramado	Abierto SARA	240.000 €	N/D	N/D	CON 77/24. Se inició en 2024, se cerró el expediente por falta de disponibilidad presupuestaria.
Método CES/CER	Mayo 2024		Reprogramado					
Prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de competencia municipal y control analítico	Junio 2024		Reprogramado					

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

49




3.28. Servicios sociales**SERVICIOS SOCIALES**

Objeto	Fecha prevista inicio	Fecha real de inicio	Estado	Tipo de contrato	Precio base de licitación	Precio de adjudicación	Desviación (%)	Observaciones
Atención a menores adolecentes	Mayo 2024		Reprogramado					
Programas de empleo	Abril 2024	19/03/2024	Resuelto	Abierto ordinario		271.180 €	-3,15%	CON 12/24 Servicio de activación e inserción laboral para colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social
Mediación	Mayo 2024	11/07/2024	Resuelto	Abierto ordinario	121.074 €	119.742 €	-1,10%	CON 45/24 Orientación Familiar y Mediación Familiar y Comunitaria dirigido a familias y vecinos del municipio

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024

50





4. Tabla resumen por Centros Gestores

A modo de conclusión, elaboraremos una tabla resumen con el total de centros gestores, en la que conste el nº de contratos realmente tramitados respecto de los previstos en el Plan de Contratación por cada uno de ellos, el nº de contratos tramitados no programados, el nº de contratos no tramitados y el % ejecución respecto al Plan de Contratación 2024.

De los datos podemos extraer que el promedio de ejecución del Plan de Contratación ha sido del 65,87%.

Asimismo, hemos considerado relevante para la evaluación de la ejecución del Plan incluir como Anexo, un resumen del análisis de cifras elaboradas por el Servicio de Contratación a nivel anual, extraídas de los informes relativos al Control Financiero Permanente del Servicio de Contratación durante el ejercicio 2024.

Lo que se informa, a los efectos oportunos.

En San Sebastián de los Reyes, a fecha de firma.


La Jefa de Sección de Contratación Electrónica,
Seguimiento de la Contratación y Compras.

Conforme: El Director de Contratación y Patrimonio.

Centro gestor	Nº de contratos programados	Nº contratos tramitados sobre programados	Nº contratos no tramitados	Nº contratos tramitados no programados	Nº contratos tramitados en total	% ejecución tramitados sobre el nº contratos programados
Asesoría Jurídica	1	0	1	0	0	0,00%
Contratación y Compras	8	4	4	1	5	50,00%
Comunicación	3	3	0	1	4	100,00%
Cultura	5	3	2	3	6	60,00%
Deportes	1	0	2	1	1	0,00%
Desarrollo Local	1	1	0	0	1	100,00%
Educación	3	3	0	1	4	100,00%
Festejos	9	8	1	15	23	88,89%
Igualdad	1	1	0	0	1	100,00%
Informática	11	7	3	3	10	63,64%
Juventud	5	5	0	1	6	100,00%
Limpieza viaria y residuos	2	2	0	0	2	100,00%
Mantenimiento y regeneración urbana	10	5	5	2	7	50,00%
Medio Ambiente	3	1	2	4	5	33,33%
Obras Públicas	2	1	1	2	3	50,00%
Organización y calidad	1	1	0	0	1	100,00%
Participación Ciudadana	1	1	0	0	1	100,00%
Patrimonio	1	1	1	1	2	100,00%
Promoción del transporte y movilidad	2	1	1	0	1	50,00%
Planificación	4	0	4	0	0	0,00%
Policía Local	6	1	5	3	4	16,67%
Protección Civil	2	1	1	0	1	50,00%

Informe de Seguimiento del Plan de Contratación 2024


52



El documento ha sido firmado por :

- 1.- Mercedes Valls Palomino, Contratación - Jefa de Sección de Contratación Electrónica, Seguimiento de la Contratación y Compras, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/04/2025 09:48
- 2.- Laura Escribano Fernandez, en nombre de Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/04/2025 09:57

Recursos Humanos	3	4	0	2	6	133,33%
Atención Ciudadana	1	1	0	0	1	100,00%
Salud	3	0	3	0	0	0,00%
Servicios Sociales	3	2	1	0	2	66,67%
TOTAL	92	57	37	40	97	65,87%





5. Anexo-Memoria del Servicio de Contratación

• Incidencias tramitadas durante el ejercicio 2024

Con independencia del Plan de Contratación del ejercicio, existen otros contratos e incidencias que se tramitan en el Servicio de Contratación y cuyo análisis incluimos en este informe de seguimiento, como anexo al mismo, considerando que aporta información adicional.

Hay que distinguir entre los conceptos de “expedientes en tramitación o vivos” y los “expedientes pendientes de tramitar”, cuya aclaración realizamos a continuación:

Por *expediente en tramitación* entendemos los contratos “vivos”, es decir, contratos que están actualmente en ejecución y, por tanto, sometidos como expedientes administrativos que son a otros actos de trámite tales como, tramitación de prórrogas, modificaciones, revisiones de precios, continuidades, devoluciones de fianzas, vistas de expedientes, trámites de audiencia, etc.

Esto es lo que en el Servicio de Contratación denominamos “incidencias” de los contratos, que no dejan de ser los actos de trámite derivados de la ejecución de los contratos, y que se detallan en el Anexo I del cuadro Excel adjunto.

Durante el ejercicio 2024 hemos tenido una media de **436 contratos en vigor**, en ejecución (sin incluir los que están con licitación en marcha), que han llevado aparejadas **266 incidencias** a lo largo del año.


Haciendo un resumen de las cifras anteriores, podemos decir que:

CONCEPTO	CIFRA
Nº DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2024	113
Nº DE CONTRATOS ANTERIORES EN VIGOR (VENCIMIENTOS)	436
Nº DE INCIDENCIAS DURANTE 2024	266

Si desglosamos el nº de incidencias tramitadas por conceptos, podemos obtener los siguientes datos, siendo las prórrogas las que acaparan el 27% de las incidencias tramitadas, las liquidaciones un 23,68% de las mismas y la elaboración de nuevos pliegos y trámites relacionados con la Transparencia un 14,28%.



Nº DE INCIDENCIAS TRAMITADAS POR CONCEPTOS (EJERCICIO 2024)

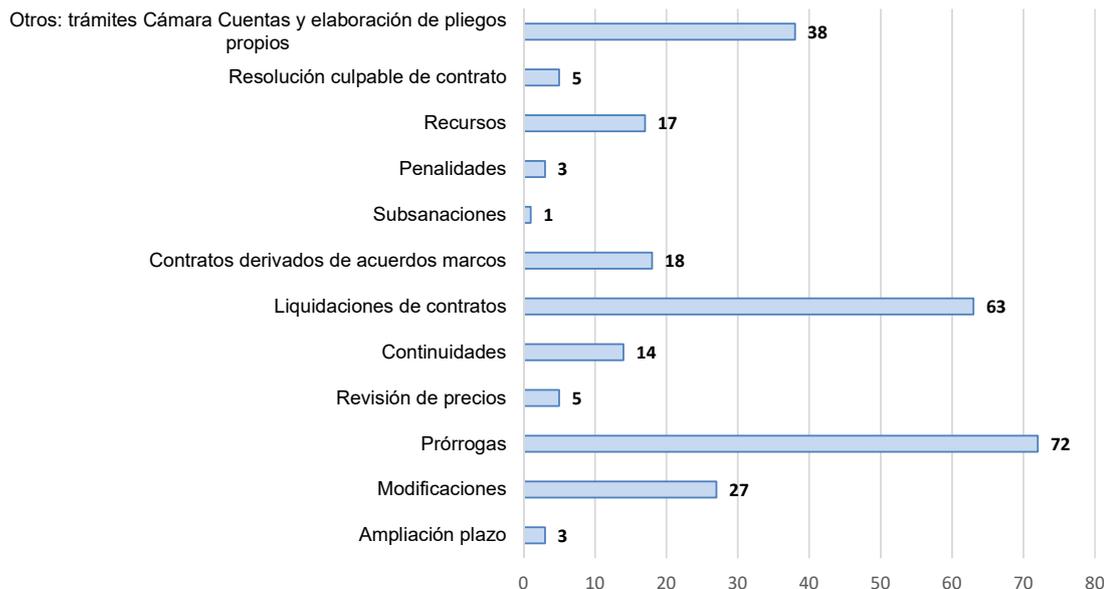

- **Análisis de tiempos en la tramitación y ejecución de los contratos**

El Servicio de Contratación está sometido a dos tipos de tiempos de tramitación y ejecución.

Por un lado, el establecido legalmente por la LCSP en función del tipo de procedimiento utilizado en cada modalidad de contrato y por resto de normativa aplicable.

Por otro lado, el marcado por la propia organización, esto es, debe tenerse en cuenta que, al periodo anterior, hay que sumar el tiempo para la realización de los actos preparatorios (priorización de proyectos dependiente de toma de decisión política, elaboración de pliegos, retención de crédito, informes, aprobación por el órgano de contratación, etc.). Del mismo modo, puede suceder que en la propia licitación surjan incidencias, sobre todo en los contratos susceptibles de recurso especial. Obviamente los plazos citados se incrementarían en caso de expedientes que requieran trámites especiales, bien porque incorporen cláusulas de revisión de precios o porque requieran la emisión de informes (por ejemplo, de la Oficina Nacional de Evaluación).



Además, debe reseñarse el tiempo que dedica el Servicio de Contratación a reuniones con centros gestores para coordinación y resolución de dudas y consultas de pliegos, convocatorias de mesas de contratación, estudio de documentación presentada por licitadores y adjudicatarios de contratos, etc. Por todo ello, es esencial que los expedientes se inicien con antelación suficiente para poder cumplir los plazos.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos distinguir entre los siguientes conceptos:

La fecha prevista de inicio de licitación: se refiere a la fecha en que se publicaría el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Esta fecha debe ir en consonancia con la fecha prevista de inicio de ejecución del contrato, que se refiere a la fecha en la que se pretende que entre en vigor el contrato. En caso de que estemos ante un contrato que da continuidad a otro anterior, deberá tenerse en cuenta en qué momento finaliza el primero para planificar adecuadamente el inicio de licitación y evitar caer en continuidades de ejecución o reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno.

Por todo ello, según el procedimiento de licitación que debamos aplicar, necesitaremos licitar con una antelación "realista" como mínimo de:

- Abierto simplificado abreviado: 2 meses y medio (75 días)
- Abierto simplificado ordinario: 3 meses (90 días)
- Si supera los 100.000 € tendrá recurso especial, por lo que habría que añadir al menos 15 días hábiles, es decir, 4 meses (120 días).
- Abierto ordinario: 5 meses (150 días).
- SARA: 6 meses (180 días).

Pasando a analizar las cifras obtenidas en ejercicio 2024, el tiempo medio de resolución real por tipo de procedimiento, calculado como la diferencia en días desde la fecha de incoación del expediente hasta la fecha de formalización del contrato.

En este punto, hay que resaltar que no se tiene en cuenta en el cómputo de días el plazo de "preparación" de la licitación del contrato desde que se realiza la petición desde el centro gestor (elaboración de pliegos, resolución de dudas, trámite de postmesa, petición de crédito y existencia del mismo para iniciar el trámite de incoación, etc.) hasta que se inicia la incoación del expediente.



Pasamos a analizar los datos medios obtenidos desde la fecha de incoación del expediente hasta la fecha de formalización del contrato.

- N° de procedimientos “abierto simplificado reducido”: 26. El tiempo medio de tramitación es de **67 días**.

El tiempo de resolución para la tramitación de este procedimiento, según hemos definido anteriormente, debería ser de 2 meses y medio (75 días).

Se observa que los plazos han sido adecuados considerando los tiempos de tramitación de estos expedientes, contando desde la fecha de incoación del expediente hasta la formalización.

- N° de procedimientos “abierto simplificado”: 20. El tiempo medio de tramitación es de **101 días**.

Se observa que el tiempo medio se encuentra ligeramente por encima de los parámetros considerados “realistas”, 90 días frente a 101, con lo que podemos decir que estamos en la horquilla de tiempo óptimo para este tipo de procedimientos.

- N° de procedimientos “abierto ordinario”: 12. El tiempo medio de tramitación es de **168 días**.

Se observa que también está por encima de los parámetros considerados para este procedimiento de licitación.

- N° de procedimientos “sujeto a regulación armonizada”: 14. El tiempo medio de tramitación es de **231 días**.

Se observa que el tiempo de tramitación en general ha estado muy por encima del tiempo parametrizado, unos 3 meses por encima de lo considerado “realista”, en parte, por la interposición de recursos especiales en alguno de los procedimientos.

- N° de procedimiento “negociado sin publicidad”: 41. El tiempo medio de tramitación es de **67 días**.

Se considera que está dentro de los parámetros de duración del procedimiento de licitación correspondiente.



Se presenta a continuación una tabla resumen con los datos analizados anteriormente:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº EXPEDIENTES ADJUDICADOS EJERCICIO 2024	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EJERCICIO 2024
ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO	26	67 días
ABIERTO SIMPLIFICADO	20	101 días
ABIERTO ORDINARIO	12	168 días
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA	14	231 días
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	41	67 días
Nº TOTAL EXPEDIENTES FINALIZADOS	113	127 días

